

公表用

**道道きたひろしま総合運動公園線の  
整備における環境保全を考える協議会**

**【 第 13 回 】**

**説 明 資 料**

**令和7年3月12日**

**北海道空知総合振興局  
札幌建設管理部**


1. 協議会の開催経緯、協議会の位置づけ等
  - ①協議会の位置づけ
  - ②これまでの宿題と回答
  - ③第13回協議会の議事内容
  - ④工事進捗状況
2. 環境モニタリング調査実施状況  
環境保全対策実施・検討状況
  - ①環境モニタリング調査・環境保全対策
  - ②環境モニタリング調査実施状況  
環境保全対策実施・検討状況
  - ③保全対策検討のための詳細調査
3. その他環境保全に関する事項
  - ①植生検討会
  - ②環境保全に関する情報の公表
  - ③北広島市：市道西裏線関連
4. 道路完成後の環境モニタリング計画
5. 今後の予定

# 1. 協議会の開催経緯、協議会の位置づけ等

- ①協議会の位置づけ
- ②これまでの宿題と回答
- ③第13回協議会の議事内容
- ④工事進捗状況

# 1.協議会の開催経緯、協議会の位置づけ等

## ①協議会の位置づけ 3

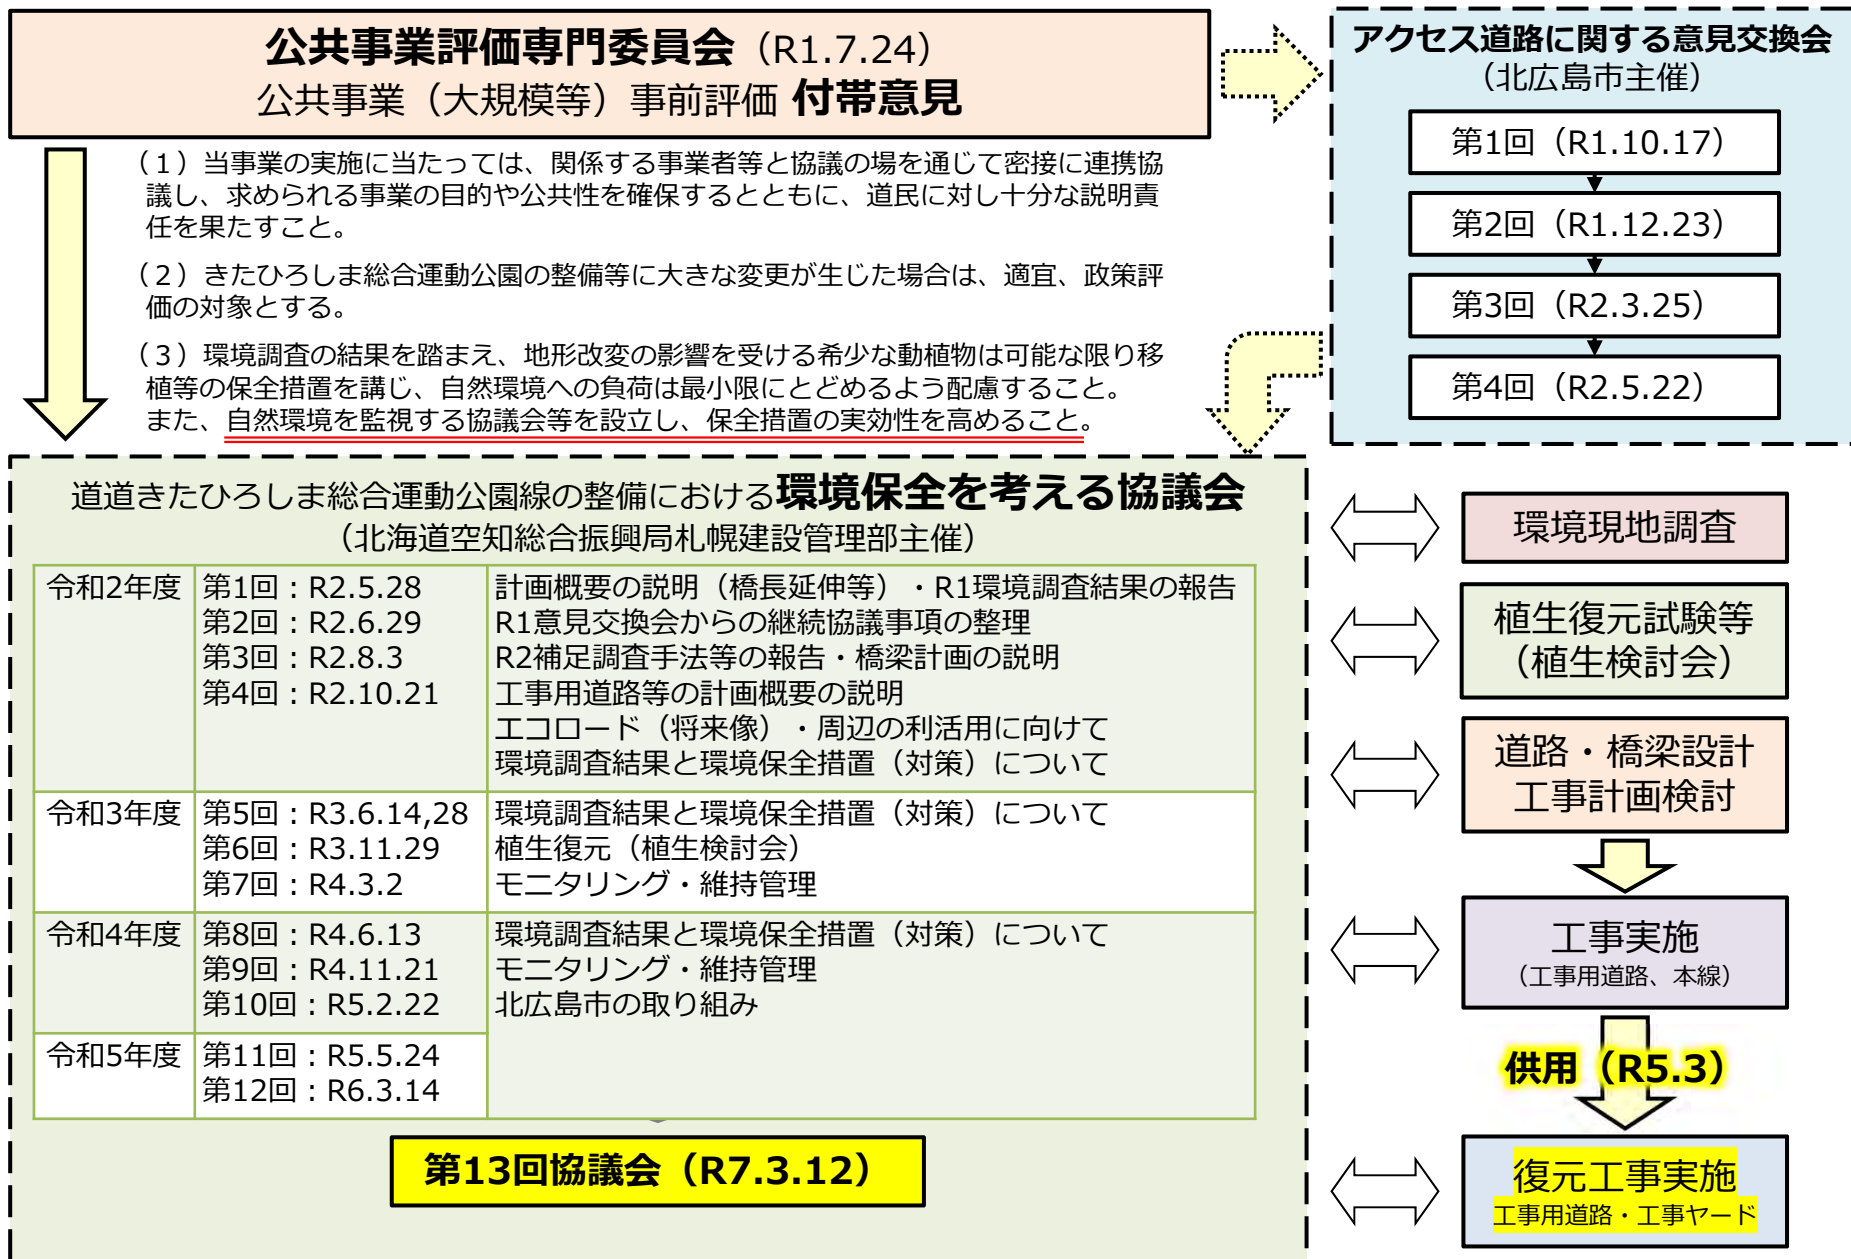

## ◆前回＝第12回協議会における宿題事項と対応案

区分	「まとめ」における宿題事項	対応方針
(第1～11回協議会における宿題事項は対応済み)		
第12回協議会 (R6.3.14)	• 保全措置モニタリング	• エゾアカヤマアリ及び植物重要種の移植後のモニタリングは、計画どおり令和5年度で終了(済)
	• 環境モニタリング調査	• コウモリの捕獲調査、昆虫類の調査は、計画通り令和5年度で終了。コウモリ類の超音波調査については1年間延伸。他は計画どおり進める。…p20
	• 保全対策検討のための詳細調査	• スロープ付き側溝の効果検証は計画通り令和5年度で終了(済)
	• オオタカの営巣地の利用	• 私有地の状況について市で調査する…p24
	• 協議会の取組の記録	• 記録の残し方は今後相談しながら進める…p43

◆第13回協議会（R7.3.12）目的と議事内容

目的	議事内容
1.工事進捗の確認	工事進捗状況：1章④
2.前回協議会（R6.3.14）以降の調査結果報告 保全対策検討・実施状況の確認	環境モニタリング調査実施状況 / 環境保全対策実施・検討状況：2章 ①環境モニタリング調査・保全対策 ②供用後（工事中）の環境モニタリング調査実施状況・環境保全対策実施状況 <ul style="list-style-type: none"> <li>・哺乳類（エゾシカ・中・小型）調査（途中経過）</li> <li>・哺乳類保全対策…北側防鹿柵の設置</li> <li>・コウモリ類超音波録音調査</li> <li>・一般鳥類調査</li> <li>・鳥類重要種繁殖状況調査（オオタカ・ハイタカ・クマゲラ）</li> <li>・オオタカ保全対策…繁殖配慮</li> <li>・クマゲラ痕跡調査</li> <li>・魚類調査</li> <li>・底生動物調査</li> <li>・水質調査</li> </ul> ③保全対策検討のための詳細調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・昆虫類前照灯誘引対策検討</li> <li>・塩害モニタリング（植物・土壌・水質）（途中経過）</li> </ul>
3.その他	その他環境保全に関する事項：4章 <ul style="list-style-type: none"> <li>①植生検討会</li> <li>②環境保全に関する情報の公表</li> <li>③北広島市：市道西裏線関連</li> </ul>
4.環境モニタリング計画	道路完成後の環境モニタリング計画
5.今後の予定	今後の予定

- 令和5年3月1日供用開始。
- 令和6年度は工事用道路の撤去、植生工、防鹿柵（北側）設置を行った。

表1.工事工程表（令和7年2月末時点）


		2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度) 3月1日供用	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度) 2月
道道きたひろしま総合運動公園線	橋梁下部工					
	Fビレッジ73橋(3号橋)					
	Fビレッジ245橋(1号橋)					
	Fビレッジ341橋(2号橋)		鳥類	鳥類		
	橋梁上部工					
	Fビレッジ73橋(3号橋)		工場製作			
	Fビレッジ245橋(1号橋)		工場製作			
	Fビレッジ341橋(2号橋)		工場製作	鳥類		
	架設・橋面					
	道路土工		鳥類	鳥類		
路盤・舗装工			鳥類			
工事用道路設置・撤去		設置		撤去	鳥類	
植生工(工事用道路部の復元)					鳥類	
シカ柵			南側	調査・検討	鳥類 北側	
昆虫類前照灯誘因対策				調査・検討、モニタリング		

※周辺で鳥類重要種の繁殖が確認されたため、配慮区域で4月～8月中旬まで工事を休止した。

## ◆令和6年度道道きたひろしま総合運動公園線工事について

- 仮橋及び工事用道路撤去工（工事用道路部の植生復元を含む）を完了。
- 北側の防鹿柵設置を完了。

起点側

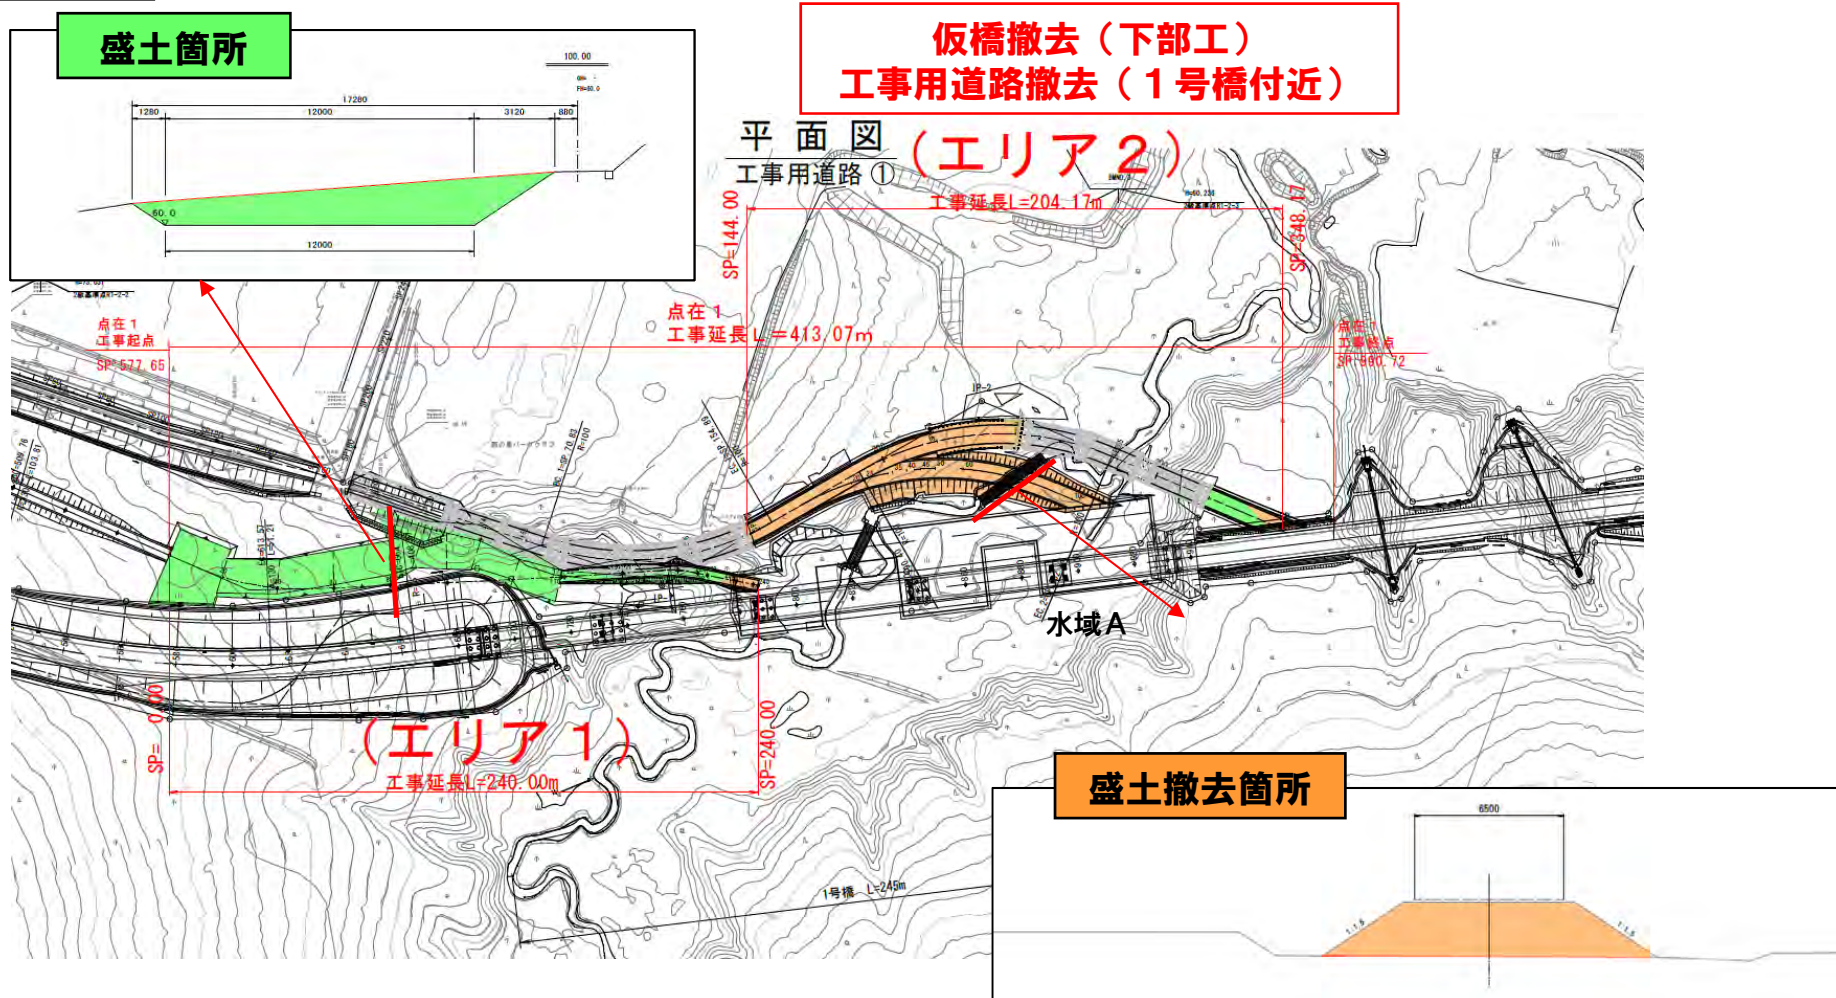


## ◆起点側 2024年（令和6年）10月撮影



Fビレッジ245橋（旧1号橋）付近 復旧後  
横断管撤去・地形復旧・法覆基材工・表土ブロック移植工

終点側

工事用道路撤去（2号橋付近・3号橋付近）



## ◆終点側 2024年（令和6年）9月撮影



Fビレッジ341橋（旧2号橋）・Fビレッジ73橋（旧3号橋）付近復旧後  
横断管撤去・地形復旧・表土ブロック移植工・法覆基材工
